


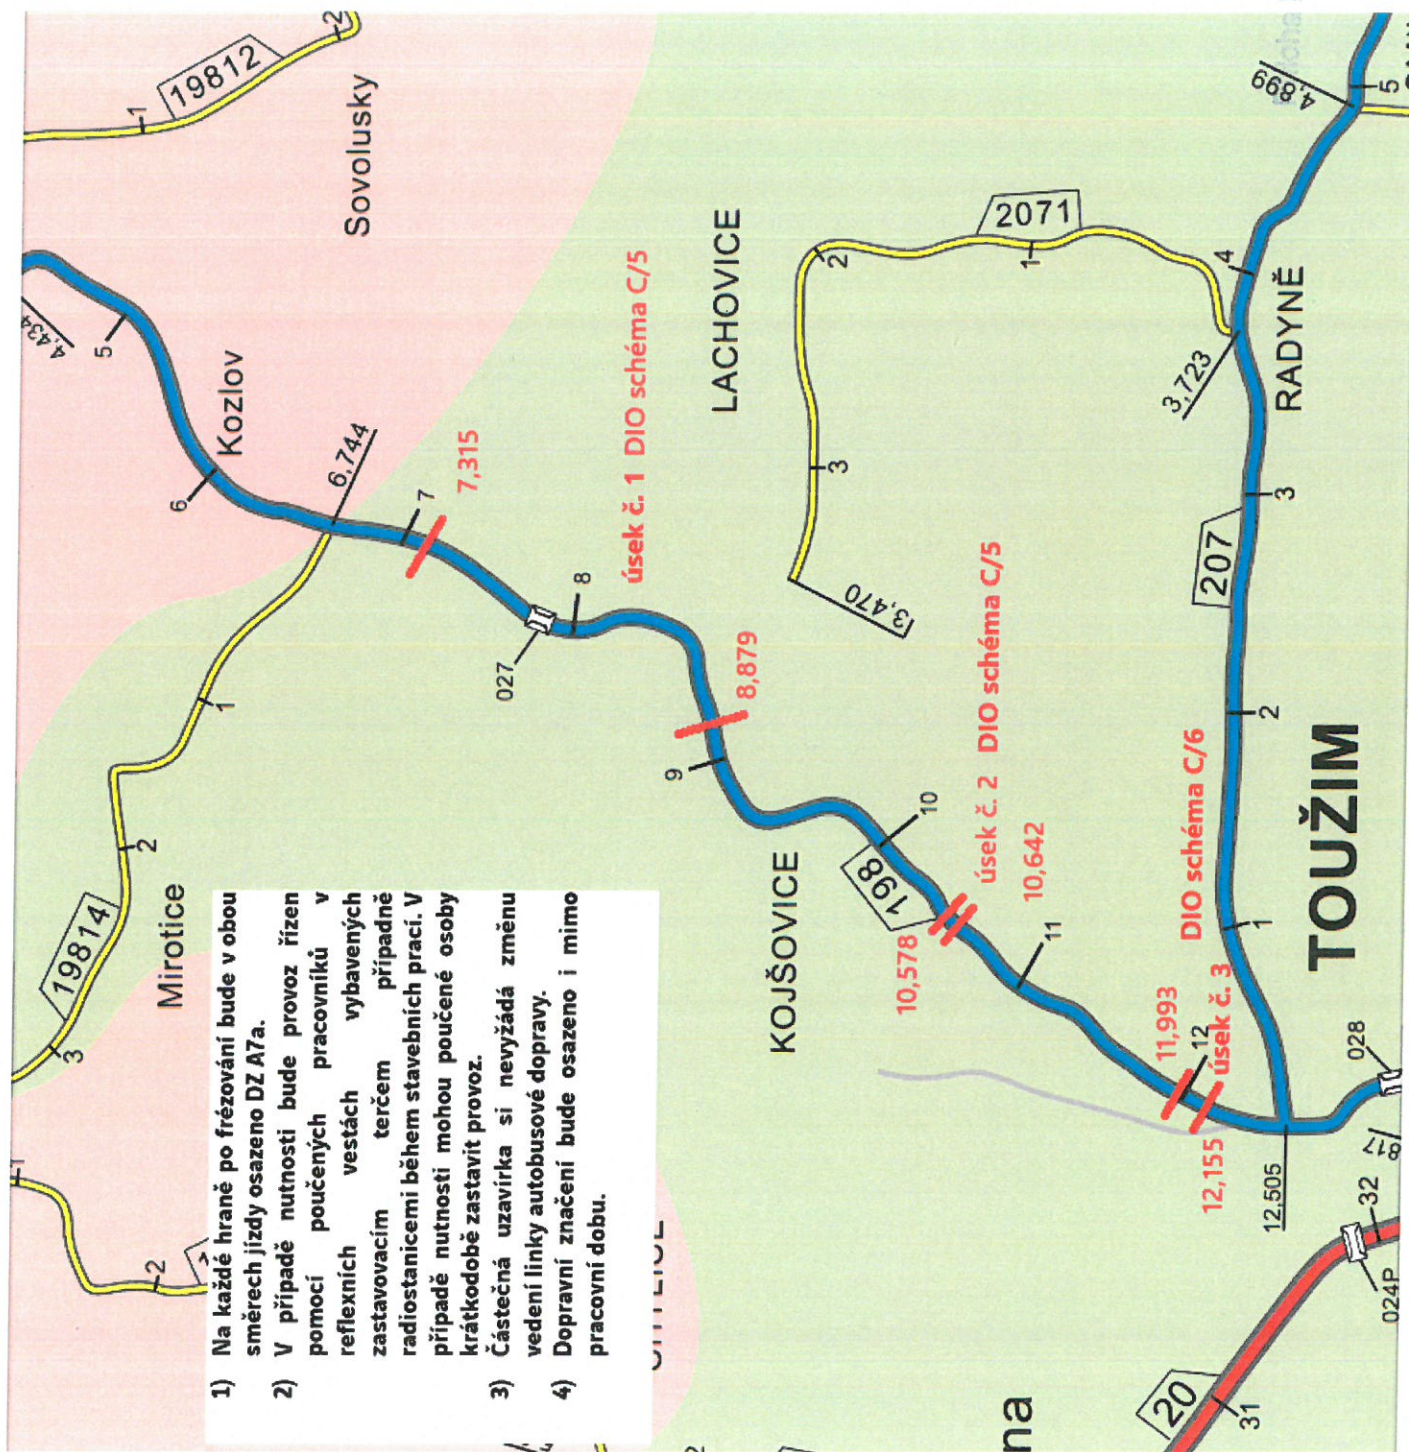

HARMONOGRAM

Stavba:

Oprava povrchu silniční/198 Mirovice-Kojšovice

Termín stavby

Od: 03.08.2026

Do: 26.08.2026

soboty

neděle

Práce o víkend

ano

ne

Svátky

ne

Č	NÁZEV ČINNOSTI	TERMÍN		POČET DNÍ	
		OD	DO		
1	DIO-velkoplošná úprava úsek č.1 km 7,315-8,879 (1.564 mb)	03.08.2026	11.08.2026	8	
2	frézování stávajícího krytu	03.08.2026	04.08.2026	2	
3	stavební práce	04.08.2026	07.08.2026	4	
4	pokládka asf.vrstev	08.08.2026	10.08.2026	2	
5	krajnice	25.08.2026	26.08.2026	2	
6	VDZ	25.08.2026	26.08.2026	2	
7					
8					
9					
10	DIO-lokalní výspravy úsek č.2 km 10,578-10,642 (64 mb); úsek č.3 km 11,993-12,155 (162 mb)	14.08.2026	26.08.2026	11	
11	frézování stávajícího krytu	14.08.2026	17.08.2026	3	
12	stavební práce	17.08.2026	21.08.2026	5	
13	pokládka	21.08.2026	24.08.2026	3	
14	krajnice	25.08.2026	26.08.2026	2	
15	VDZ	25.08.2026	26.08.2026	2	

29. 07. 2026
Průběh č. 13369102/26
313
